国立医薬品食品衛生研究所 旧庁舎解体工事について

㈱鴻池組

本工事は、平成30年1月をもって川崎市に移転した、国立医薬品食品衛生研究所庁舎跡地を国有地として関東財務局に移管する必要があるため原形復旧することを目的としてます。工事は、樹木の伐採、建築物の解体、外構等の撤去、汚染土壌の除去対策及び跡地の造成等を行います。

現在、工事は地上部分の建屋解体が終了し建屋地下躯体解体等に移行しております。本来であれば住民説明会を開催し、工事の進捗状況等をお知らせする必要がありますが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、本資料をもって今後の予定工程等をご案内するものです。

今後の予定工程表（現時点の見込み）

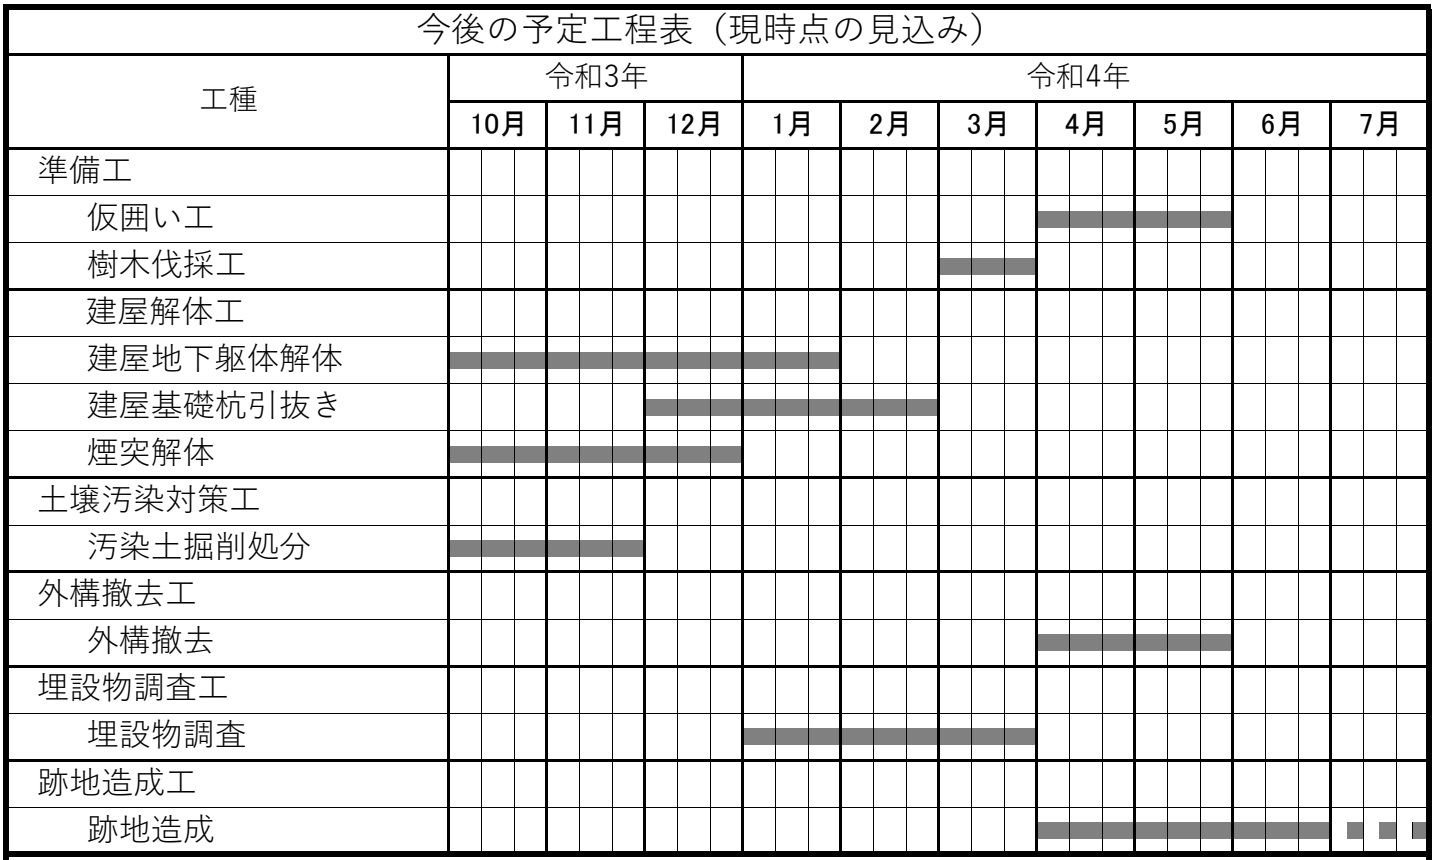

※土曜日・日曜日・祝日は休工

※当初の計画では令和2年4月に住民説明会を開催し、その後着工、令和4年3月末に工事終了を見込んでおりましたが、新型コロナウィルス感染拡大の影響により住民説明会の実施が遅れ、着工が約3ヵ月遅れました。さらに騒音・振動等を防止するために慎重に工事を進めてきたこと等により現時点で3ヵ月以上の工期延伸が見込まれている状況であり、工事の完了日は現時点では未定です。

◎現地航空写真

着工前

令和3年9月24日　現在

◎現場平面図

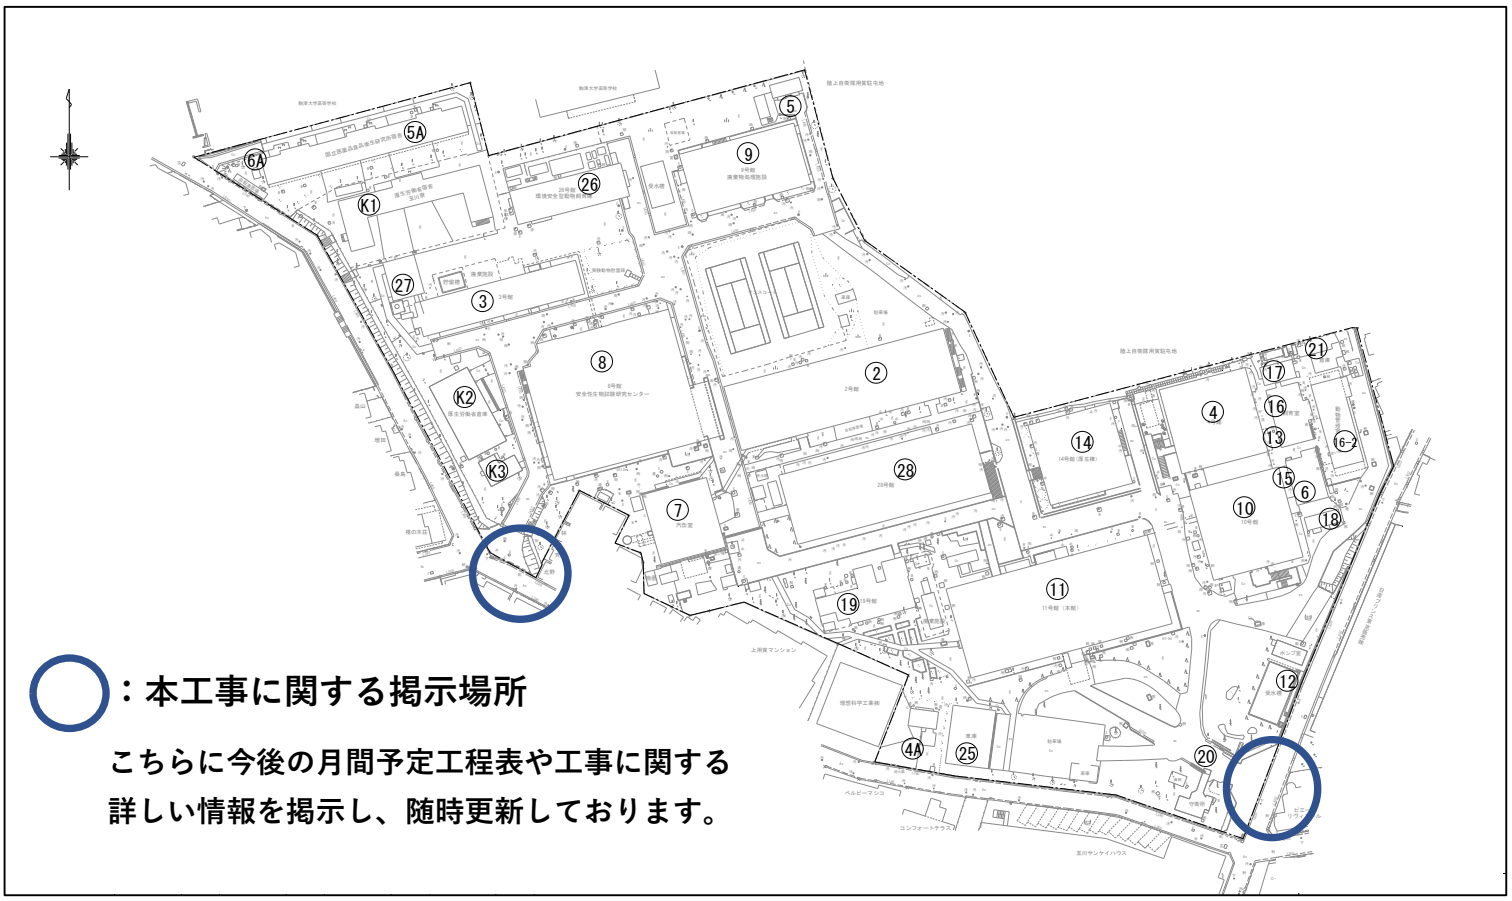

○：本工事に関する掲示場所

こちらに今後の月間予定工程表や工事に関する
詳しい情報を掲示し、随時更新しております。

●今後実施する工事の各工程においても、必要な振動・騒音・粉塵防止対策を講じますとともに、引き続き情報発信に努め、住民のみなさまへの丁寧なご説明を行ってまいります。
引き続きご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

発注者：国立医薬品食品衛生研究所（国衛研）総務部会計課
施工者：㈱鴻池組　旧国立医薬品食品衛生研究所庁舎解体工事事務所
連絡先：㈱鴻池組　志村/辰巳　03-6411-7487
工事HPのURL：http://kokueiken-kaitai.com
